

Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 2

stavby „Odstavná plocha Jeřmanice“,

který se konal v úterý 29. 05. 2018 od 17:00 hodin na stavbě

Účastníci kontrolního dne: dámy Fiebigarová a Bačkovská a pánové Šír, Tuček a Raš

Průběh kontrolního dne:

OPJ 1/2

25.05.2018

Nejpozději v pondělí 28.05.2018 zašle zhotovitel paní starostce a TDI harmonogram prací na celou stavbu

29.05.2018

Splněno, vypouští se

OPJ 1/3

25.05.2018

Zhotovitel upraví skládku výkopku do 29.05.2018

29.05.2018

Upravuje se průběžně

OPJ 1/4

25.05.2018

Zhotovitel zjistí podrobnosti ohledně Závazného stanoviska Odboru dopravy MML

29.05.2018

Probíhá

OPJ 1/5

25.05.2018

Zhotovitel předloží cenovou nabídku na změnu povrchu odstavné plochy z asfaltové na ze zámkové dlažby k odsouhlasení investorem. Změnu ceny (odpočty a přípočty) uvede do stávajícího rozpočtu. Termín: do konce tohoto měsíce

OPJ 1/6

25.05.2018

Stávající zakrytí septiku deskami PZD bude nahrazeno novou železobetonovou deskou s poklopem (poklopy) – upřesní se po odkrytí septiku. Obsah septiku bude odvezen a zlikvidován odbornou firmou

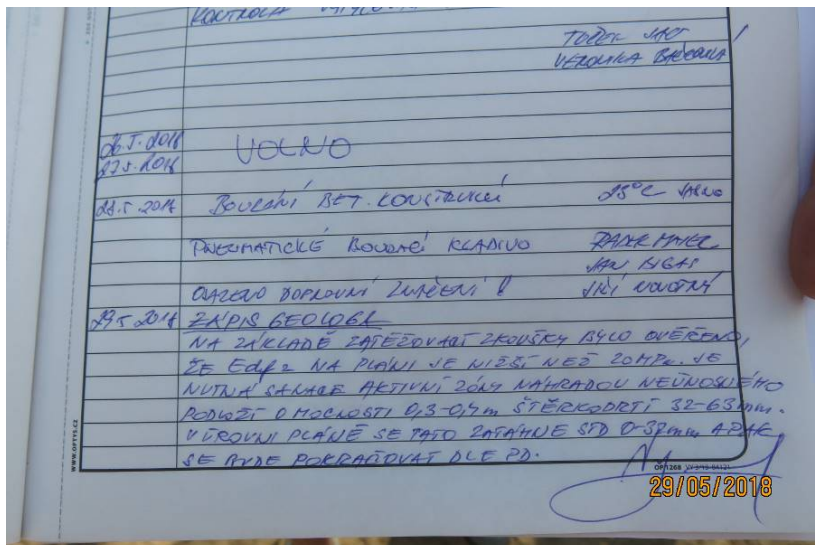
OPJ 1/7

25.05.2018

V úterý 29.05.2018 ve 14:00 hodin se na stavbu dostaví geolog RNDr. Vybíral a provede kontrolu únosnosti pláňe statickou deskou. Pokračovat v pracích na ploše odstavné plochy lze po sdělení výsledku hutnění. Zhotovitel provede úpravu stávající parapláně

29.05.2018

Výsledek hutnění byl zapsán do stavebního deníku

**OPJ 1/8**

25.05.2018

Paní starostka přítomné informovala o uzavření obchodu od 31. 05. do 11.06.2018. Zhotovitel této skutečnosti využije

29.05.2018

Opakovaná informace, vypouští se

OPJ 1/9

25.05.2018

Na konci žlabu v zadní části obchodu není dostatek zeminy pro položení žlabů. Tento stav zhotovitel napraví

OPJ 1/10

25.05.2018

Zhotovitel musí ihned vstoupit do jednání s KSSLK s informací o zahájení prací na stavbě v místě napojení na komunikaci – viz vyjádření správce komunikace

29.05.2018

Zhotovitel řeší s paní Koškovou

OPJ 1/11

25.05.2018

Zhotovitel urychleně osadí dopravní značky podle rozhodnutí PČR, aby byla zajištěna bezpečnost nejen prostředků a lidí stavby, ale také cestující veřejnosti

29.05.2019

Splněno, vypouští se

OPJ 1/12

25.05.2018

Nejpozději na příštím KD stavby pí. starostka předloží typ přístřešků, aby se předešlo případné kolizi při jejich osazování v pozdějším období

29.05.2018

Splněno, vypouští se



Příští kontrolní den stavby se uskuteční ve středu 06.06.2018, čas bude upřesněn

Zapsal: Stanislav Raš, TDI
